


世田谷区本庁舎等整備工事 地域貢献提案額達成状況（令和7年6月末時点）

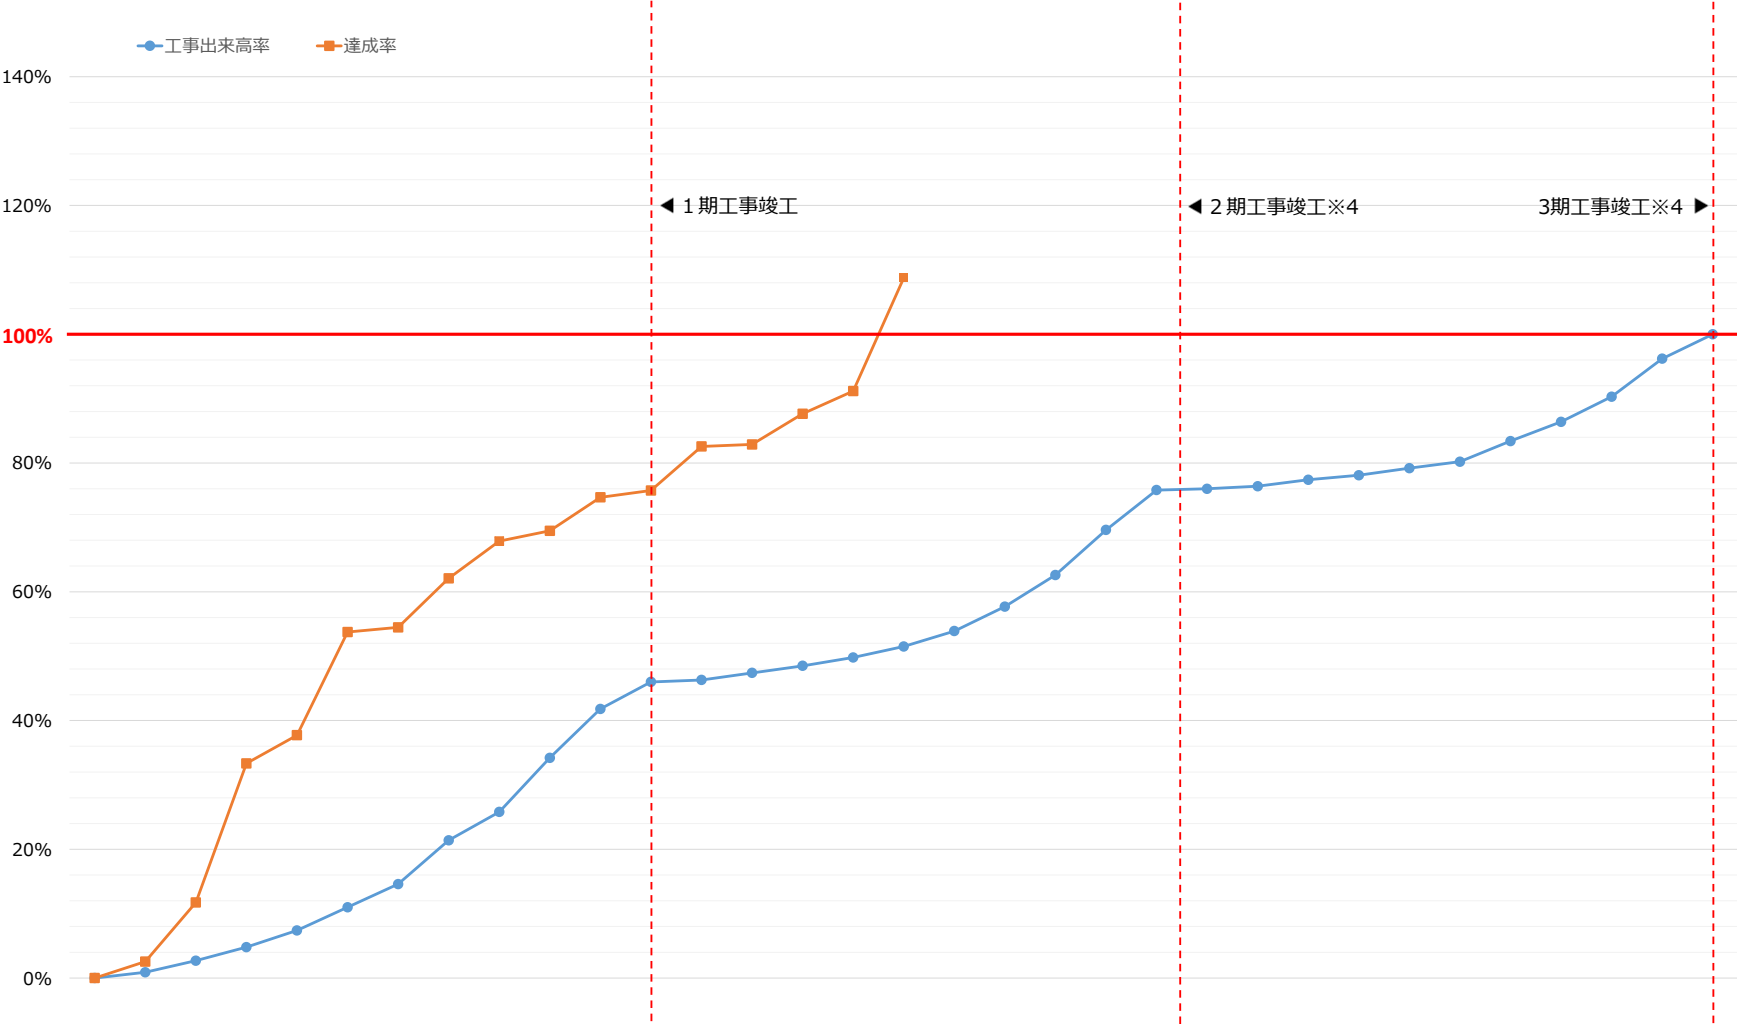

| 年             | 2021年 |      |       |       | 2022年 |       |       |       | 2023年 |       |       |       | 2024年 |       |       |       | 2025年  |       |       |       | 2026年 |       |       |       | 2027年 |       |       |       | 2028年  |       |       |       | 2029年  |  |  |  |
|---------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|
| 年度            | 令和3年度 |      |       |       | 令和4年度 |       |       |       | 令和5年度 |       |       |       | 令和6年度 |       |       |       | 令和7年度  |       |       |       | 令和8年度 |       |       |       | 令和9年度 |       |       |       | 令和10年度 |       |       |       | 令和11年度 |  |  |  |
| 月             | 6月末   | 9月末  | 12月末  | 3月末   | 6月末   | 9月末   | 12月末  | 3月末   | 6月末   | 9月末   | 12月末  | 3月末   | 6月末   | 9月末   | 12月末  | 3月末   | 6月末    | 9月末   | 12月末  | 3月末   | 6月末   | 9月末   | 12月末  | 3月末   | 6月末   | 9月末   | 12月末  | 3月末   | 6月末    | 9月末   | 12月末  | 3月末   | 6月末    |  |  |  |
| 工事出来高※1       | 0.0%  | 0.9% | 2.7%  | 4.8%  | 7.4%  | 11.0% | 14.6% | 21.4% | 25.8% | 34.2% | 41.8% | 46.0% | 46.3% | 47.4% | 48.5% | 49.8% | 51.5%  | 53.9% | 57.7% | 62.6% | 69.6% | 75.8% | 76.0% | 76.4% | 77.4% | 78.1% | 79.2% | 80.2% | 83.4%  | 86.4% | 90.3% | 96.2% | 100.0% |  |  |  |
| 地域貢献額※2       | 0     | 204  | 939   | 2,665 | 3,016 | 4,297 | 4,355 | 4,964 | 5,426 | 5,554 | 5,970 | 6,055 | 6,602 | 6,627 | 7,008 | 7,289 | 8,695  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      |  |  |  |
| 提案金額に対する達成率※3 | 0.0%  | 2.6% | 11.8% | 33.3% | 37.7% | 53.7% | 54.5% | 62.1% | 67.9% | 69.5% | 74.7% | 75.7% | 82.6% | 82.9% | 87.7% | 91.2% | 108.8% |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |       |       |        |  |  |  |

※1 工事出来高は工程表に基づく、予定の数値 ※2 地域貢献額は工事着手時からの契約金額に基づく累計金額（単位：百万円） ※3 提案金額は7,995,680,000円  
※4 2期完成日（令和8年10月23日）、3期完成日（令和11年6月8日）は、令和5年9月7日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で報告した「世田谷区本庁舎等整備工事における工程遅延に係る経緯等報告書（2・3期工事）等の検証結果について」に記載の完成日
