


世田谷区本庁舎等整備工事 地域貢献提案額達成状況（令和7年12月末時点）

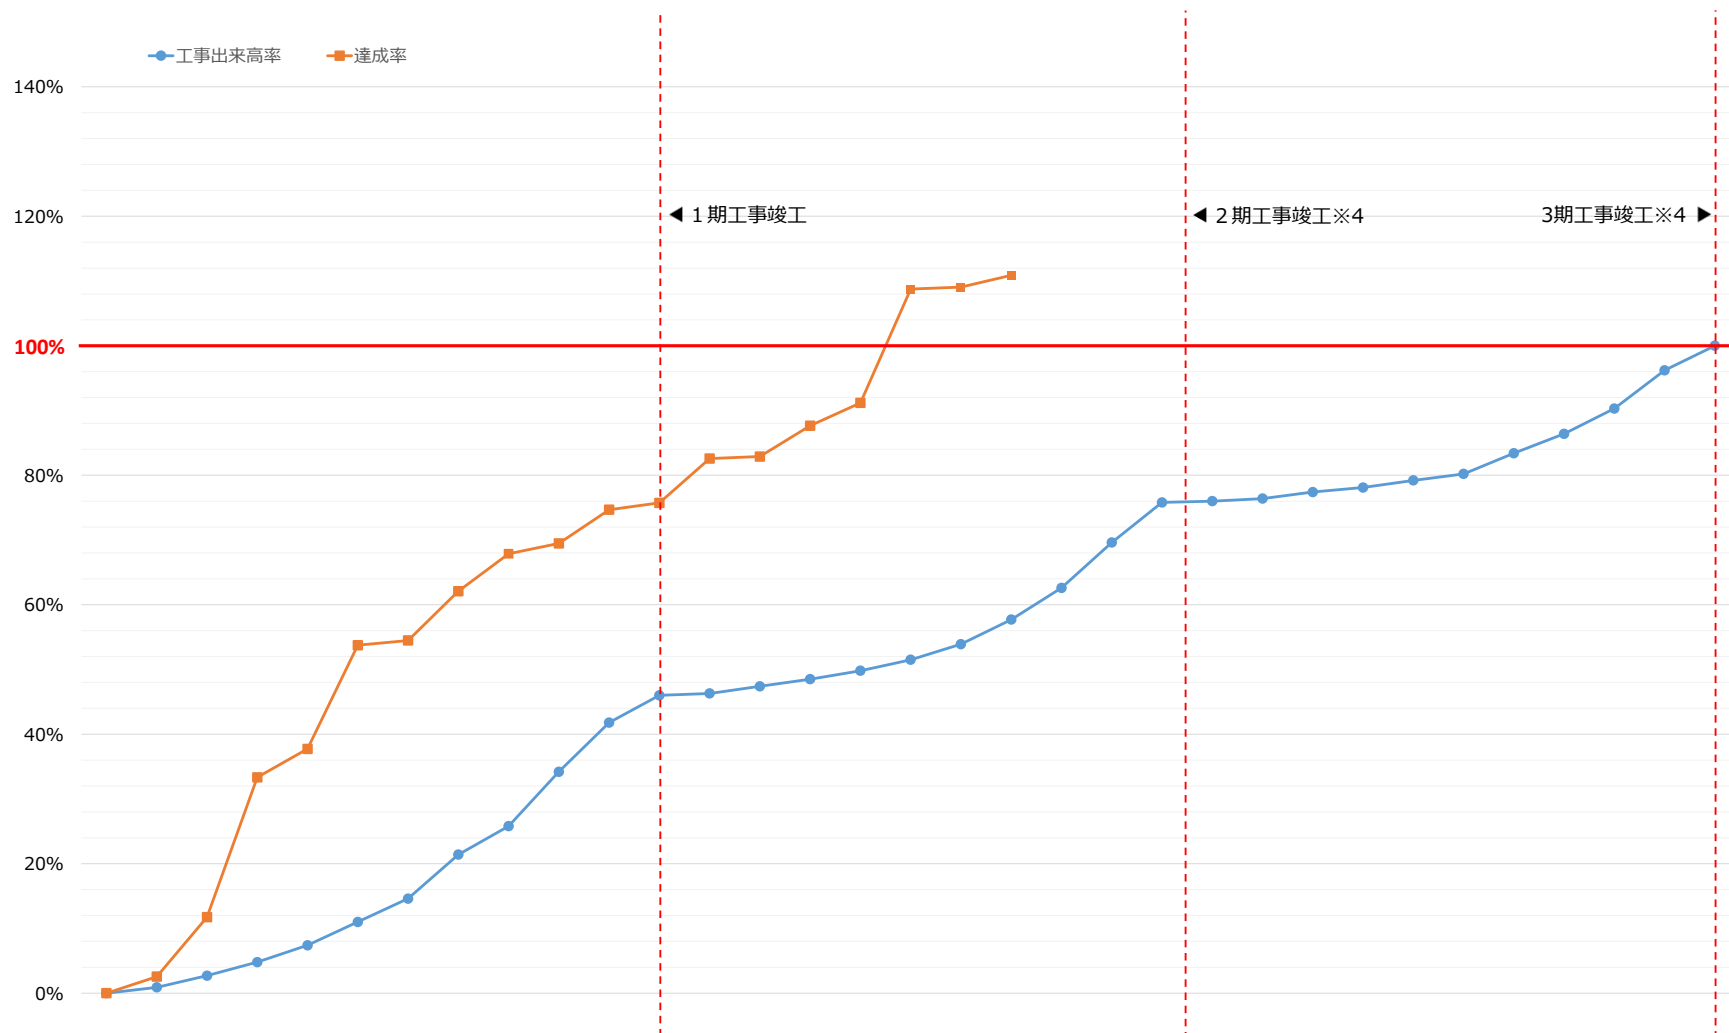

年	2021年			2022年			2023年			2024年			2025年			2026年			2027年			2028年			2029年								
年度	令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6年度			令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度								
月	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末							
工事出来高※1	0.0%	0.9%	2.7%	4.8%	7.4%	11.0%	14.6%	21.4%	25.8%	34.2%	41.8%	46.0%	46.3%	47.4%	48.5%	49.8%	51.5%	53.9%	57.7%	62.6%	69.6%	75.8%	76.0%	76.4%	77.4%	78.1%	79.2%	80.2%	83.4%	86.4%	90.3%	96.2%	100.0%
地域貢献額※2	0	204	939	2,665	3,016	4,297	4,355	4,964	5,426	5,554	5,970	6,055	6,602	6,627	7,008	7,289	8,695	8,719	8,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
提案金額に対する達成率※3	0.0%	2.6%	11.8%	33.3%	37.7%	53.7%	54.5%	62.1%	67.9%	69.5%	74.7%	75.7%	82.6%	82.9%	87.7%	91.2%	108.8%	109.1%	110.9%														

※1 工事出来高は工程表に基づく、予定の数値 ※2 地域貢献額は工事着手時からの契約金額に基づく累計金額（単位：百万円） ※3 提案金額は7,995,680,000円

※4 2期完成日（令和8年10月23日）、3期完成日（令和11年6月8日）は、令和5年9月7日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で報告した「世田谷区本庁舎等整備工事における工程遅延に係る経緯等報告書（2・3期工事）等の検証結果について」に記載の完成日
