


世田谷区本庁舎等整備工事 地域貢献提案額達成状況（令和4年9月末時点）

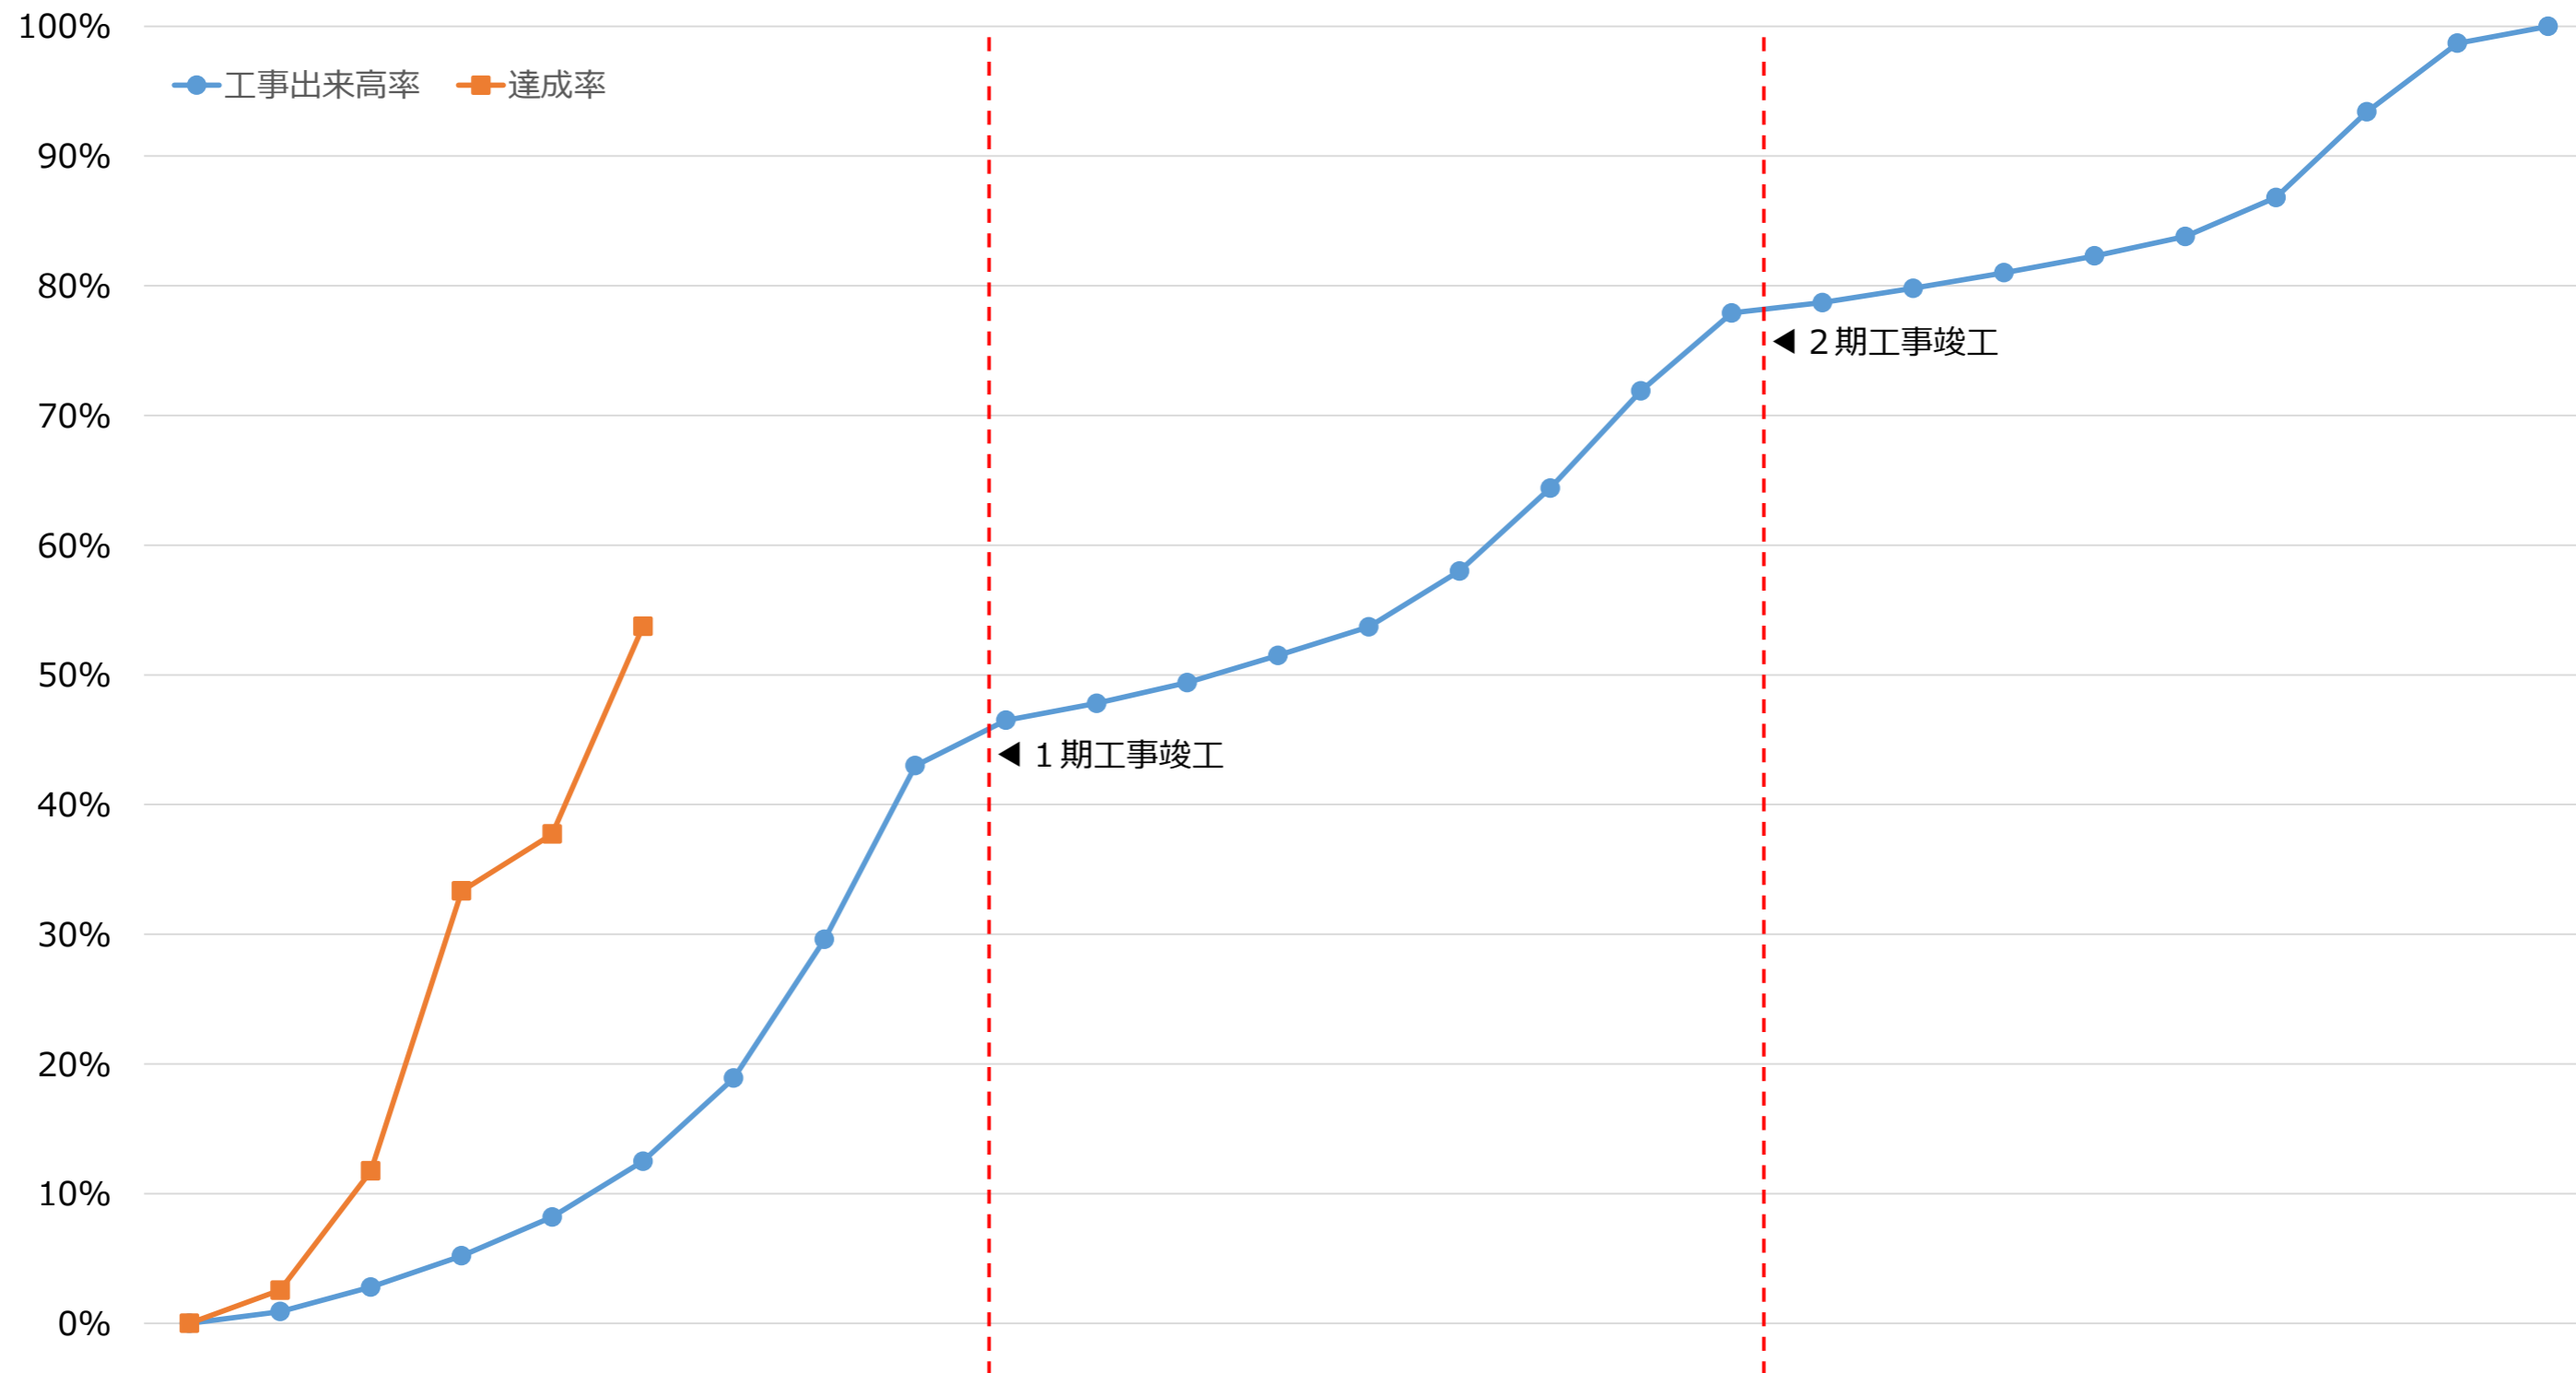

年	2021年				2022年				2023年				2024年				2025年				2026年				2027年		
年度	令和3年度				令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度				令和9年度		
月	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	12月末	3月末	6月末	9月末	10月末
工事出来高※1	0.0%	0.9%	2.8%	5.2%	8.2%	12.5%	18.9%	29.6%	43.0%	46.5%	47.8%	49.4%	51.5%	53.7%	58.0%	64.4%	71.9%	77.9%	78.7%	79.8%	81.0%	82.3%	83.8%	86.8%	93.4%	98.7%	100.0%
地域貢献額※2	0	204	939	2,665	3,016	4,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
提案金額に対する達成率※3	0.0%	2.6%	11.8%	33.3%	37.7%	53.7%																					

※1 工事出来高は、工程表に基づく予定の数値 ※2 地域貢献額は工事着手時からの契約金額に基づく累計金額（単位：百万円） ※3 提案金額は7,995,680,000円
