



本庁舎等整備の各工期の完成予定日変更について

日頃より、世田谷区政にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

世田谷区本庁舎等整備工事の1期工事の完成予定日については、本庁舎等整備 News 20号でご案内したとおり、令和5年7月末から9月末に変更となりました。今回は2期・3期工事の予定についてお知らせします。

1期工事で生じた2か月間の遅れにつきましては、2期・3期の工事期間をそれぞれ1か月短縮し、対応します。これにより、全体工事の完成予定日（令和9年10月）に変更はありません。2期以降の工事は、プレキャスト化工法（工場などであらかじめ成型した部材を現場で組み立てる工法）の採用、1期工事で得た施工実績の反映等により、より効率的かつ安全に行ってまいります。

工事の施工に際して、引き続き、ご近隣・地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全第一で進めてまいりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。


工事概要	
工事場所	世田谷区世田谷4丁目21番(東敷地)、22番(西敷地)
工事内容	・東棟新築工事、区民会館改修工事、西棟新築工事 ・上記工事に伴う電気設備及び機械設備工事 ・既存第一庁舎、第二庁舎、第三庁舎、分庁舎解体工事
工事期間	【変更前】 1期工事:令和3年7月～令和5年 7月まで 2期工事:令和5年8月～令和7年 9月まで 3期工事:令和7年9月～令和9年10月まで 【変更後】 1期工事:令和3年 7月～令和5年 9月まで 2期工事:令和5年10月～令和7年10月まで 3期工事:令和7年10月～令和9年10月まで
施工者	大成建設株式会社 東京支店

<工事期間変更内容>



<工事現場の仮囲いの位置変更について>

2期工事では、第1庁舎及び第3庁舎を含む範囲が工事エリアとなることから、仮囲いの位置が変更となります。計画の詳細は、令和5年10月頃から区役所第1庁舎1階のInfo-ba（場）に展示します。

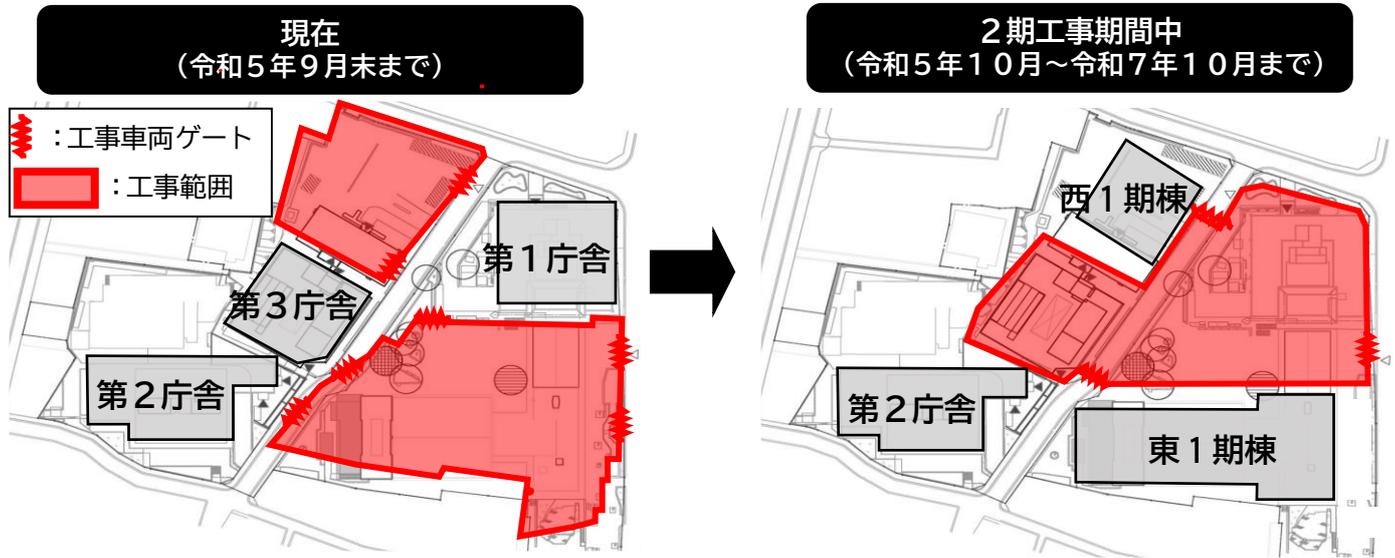

バスロータリー北側にサイクルポートを設置しました

区が民間事業者と協定を締結の上、実施中のシェアサイクル実証実験の一環として、本庁舎にシェアサイクルポートを設置しましたのでお知らせします。

- 運営事業者：OpenStreet 株式会社
(展開事業名：HELLO CYCLING)
- 設置日：令和5年2月20日（月）～
- 設置場所：バスロータリー北側
- 設置台数：9台分



世田谷区新庁舎等完成イメージ動画

新庁舎及び改修後の区民会館の外観、東側・西側アプローチからの動線、広場などのイメージを掴んでいただけるよう完成イメージ動画を「YouTube」に掲載しています。ぜひ、ご覧ください。



世田谷区新庁舎等の完成イメージ動画
YouTube 公式チャンネル「SetagayaCity」

+プラスワン

- これまで発行した本庁舎等整備Newsや工事Newsは区HPをご覧ください。
- 工事の概要や作業所HPへのリンクを区HPで公開しています。ぜひご覧ください。

トップページ > 目次から探す > 区政情報 > 区の政策 > 方針 > 本庁舎等整備について



<発行> 2023年3月

世田谷区 庁舎整備担当部 庁舎管理担当課
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
電話 03-5432-2088 ファクシミリ 03-5432-3006

