

令和4年11月11日
 スポーツ推進部
 みどり33推進担当部

上用賀公園拡張用地の暫定整備について

1. 主旨

上用賀公園拡張用地の暫定利用について、整備内容を報告する。なお、当初は今年度中の整備工事完了に向けて調整を進めてきたが、整備内容に関して地域住民の意見を踏まえた仕様等の調整に時間を要したことにより、年度内に工事が完了しない見込みとなったため、今年度予算については、第4回区議会定例会の繰越明許にかかる補正予算として提案し、引き続き早期整備を目指す。

2. これまでの経緯

上用賀公園拡張整備事業の計画検討における住民との意見交換の機会において、暫定開放における利用についても周知・意見聴取を行った。その中で、地域住民より出入口からの利用者の飛出しや砂ぼこり対策等を求める意見があり、整備内容へ反映した。

令和4年2月 都市整備常任委員会、スポーツ・交流推進等特別委員会
 6月 住民説明会
 8月～10月 ワークショップ4回、オープンパーク2回

3. 暫定整備概要


所在地 上用賀四丁目36番

面積 約1,800㎡(広場 約1,400㎡、出入口からの通路 約400㎡)

拡張計画地約31,000㎡のうち一部

整備内容 ダスト舗装、防球ネット、ベンチ、散水栓等を整備し、球技やボール遊びができる広場とする。

運営方法 日中は自由開放を基本とし、一部団体利用枠を設けることを予定する。

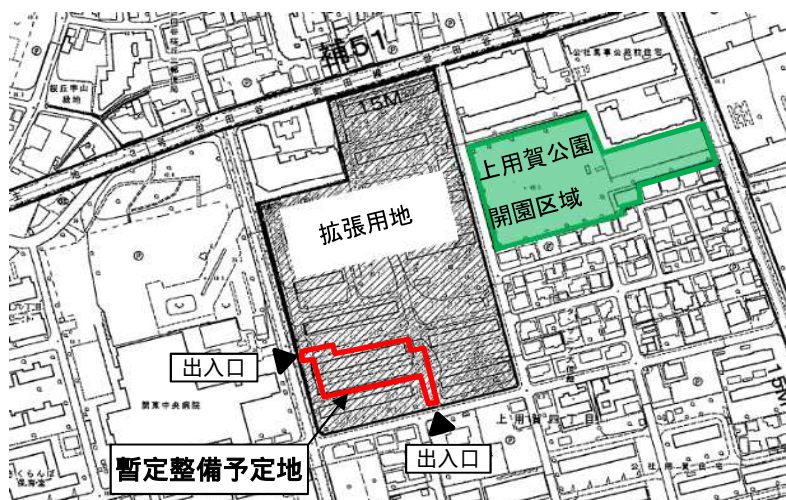

4. 予算

47,000千円

第4回区議会定例会に、繰越明許にかかる補正予算として提案予定。

5. 今後のスケジュール(予定)

令和5年 1月～6月	暫定整備工事(準備工事含む)
令和5年 7月	暫定開放開始
令和7年度以降	上用賀公園拡張整備工事のため閉鎖(開放終了) 拡張用地本整備開始
令和9年度以降	上用賀公園拡張用地本整備完了
