


案件名 2期工期短縮に係る検討状況について

本庁舎等整備工事は、令和5年7月14日、大成建設からの2期・3期の14.5か月延伸の申し入れを受け、区は、工程検証委員会を開催し、工事条件の精査等により、2期・3期工期を2.75か月の短縮を図ることとした。構造設計の変更による2期工事の更なる1.25か月の短縮については、現在、詳細検討中だが、令和6年3月下旬を目途に見極めていく。

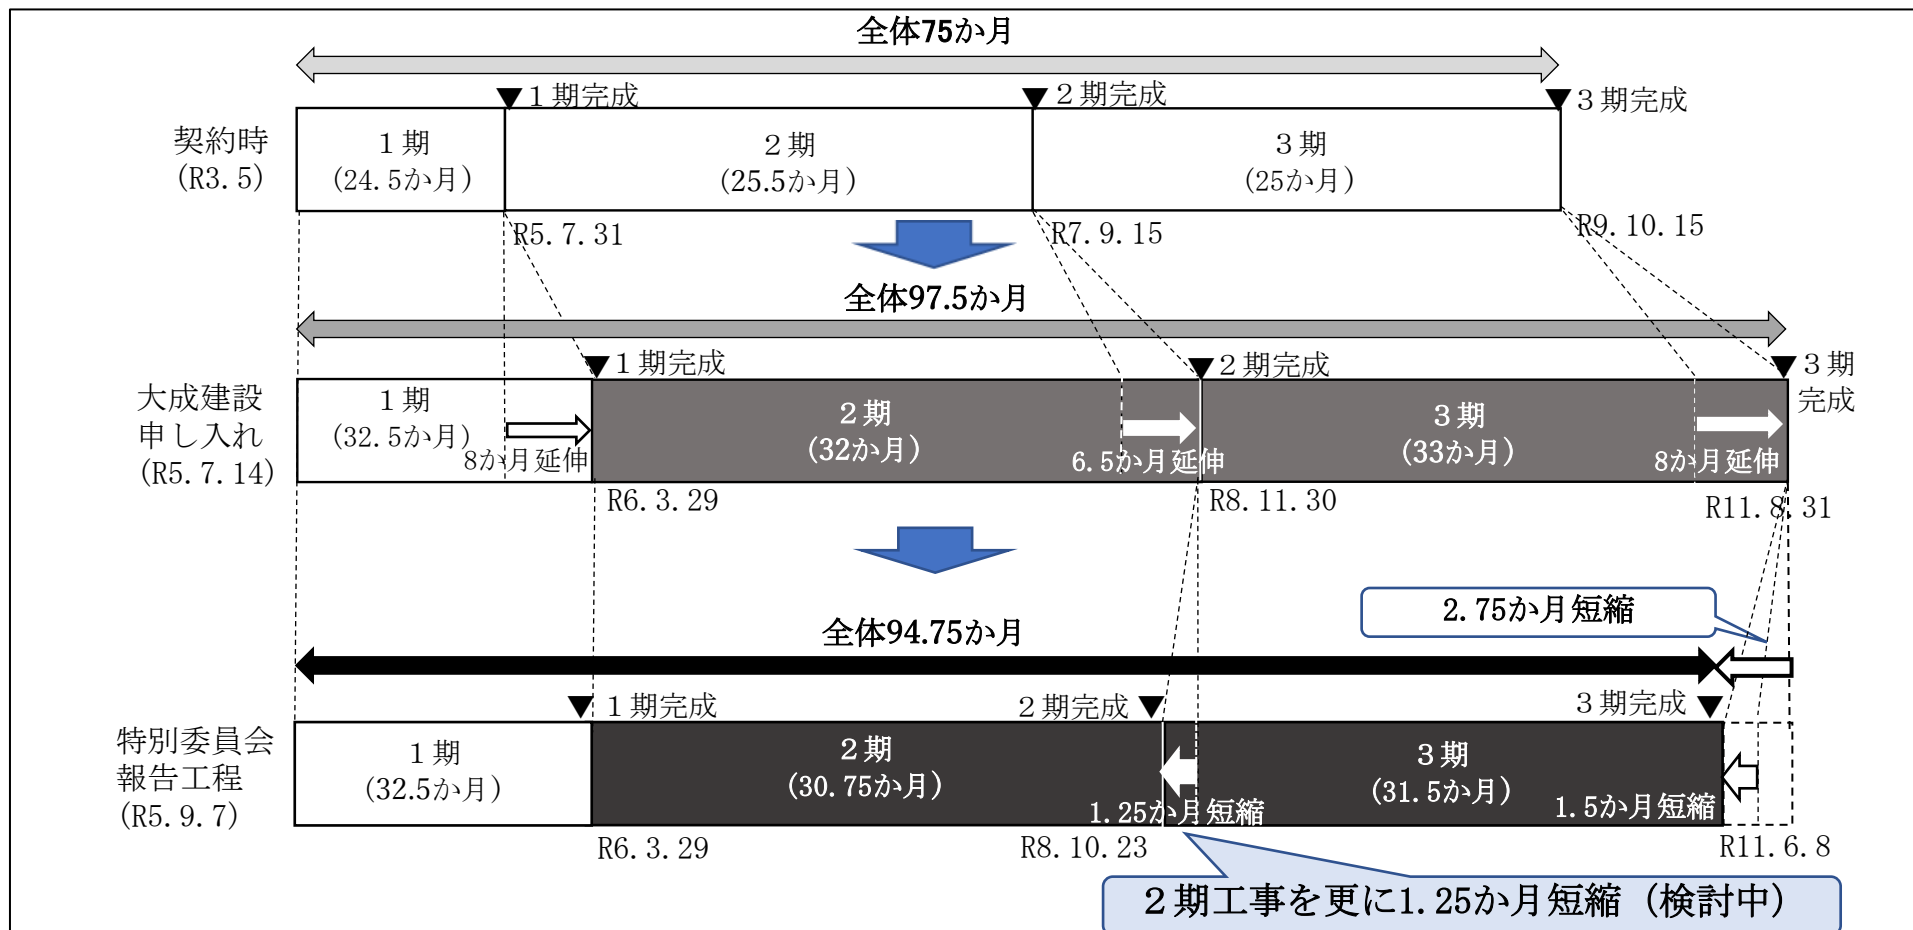

案件名 2期工事説明会の実施等について**周知
概要****① 工事説明会の開催**

下記日程で、近隣住民を対象とした工事説明会を開催する。

【第1回】令和6年3月15日（金）午後7時より

【第2回】令和6年3月16日（土）午前10時より

※会場は、第1回、第2回ともに、第3庁舎3階ブライトホール

② 工事説明資料の配布（令和6年2月29日予定）

区役所敷地の周辺街区及び世田谷区役所通り沿道の約1270世帯に対し、工事説明の概略資料を配布する。

③ 工事説明動画の配信（令和6年2月29日以降）

工事説明動画をYouTube世田谷公式チャンネルに掲載する。

④ 家屋調査の実施（令和6年3月17日（月）以降）

工事範囲に近接する家屋（約15棟）については、工事による家屋への影響の有無の判断資料作成の為、2期工事着手前に先立ち、調査会社による家屋調査を実施する。
